

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Názov projektu	Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici
Kód ITMS	223102200015
Prijímateľ (názov a sídlo)	Hlavné mesto SR Bratislava
Operačný program	Bratislavský kraj
Prioritná os	1. Infraštruktúra
Opatrenie	1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava
Skupina aktivít	1.2.3 Podpora MHD
Kód výzvy	OPBK/2012/1.2/09
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis	nie

1. Miesto realizácie projektu

Okres	Obec	Ulice	Číslo
Bratislava I	Bratislava	Floriánske nám., Radlinského, Vazovova	-

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu

Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR)	Začiatok realizácie aktivít projektu		Ukončenie realizácie aktivít projektu
	02/2012		08/2014
Výdavky projektu (v EUR)	Celkové oprávnené výdavky		130 319,32
	Z toho	NFP	123 803,35
		Vlastné zdroje	6 515,97

3. Stručný opis projektu¹

Predmetom projektu je vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici (pre električky a autobusy).

Z technického hľadiska ide o vybudovanie nových zastávok tzv. Viedenského typu na Radlinského ulici (pred daňovým úradom):

pre zastávku v smere do centra:

- vybudovanie vyvýšeného nástupišťa, čo znamená stavebné úpravy v telese jazdného pruhu,
- vybavenie nástupišťa prístreškami a štandardným vybavením zastávok v potrebnej kapacite;

v smere z centra

- vybudovanie novej prestupnej zastávky pred daňovým úradom s vyvýšeným nástupištom,
- vybavenej prístreškami v potrebnej kapacite; automatom na CL,
- zrušenie zastávky Vazovova medzi Vazovovou a Wilsonovou ulicou;

Zastávka v smere do centra by slúžila aj ako nástupná zastávka autobusovej linky 94 s priamym prestupom na električky. Zastávkou sa skrátila vzdialenosť ku školám a sociálnemu úradu na Vazovovej ulici. Zastávka v smere z centra slúži aj pre autobusy liniek 31 a 39, čím sa zabezpečí prestup bez nutnosti peších presunov.

Ďalej pokračujú (rovnako ako linka č. 59) takisto po električkovom páse až k Račianskemu mýtu..

¹ rozpisat' maximálne na 800 znakov

² v prípade že projekt prispieva k viacerým horizontálnym prioritám, je potrebné rozpisat' príspevok k cieľom HP aj plnenie ukazovateľov výsledku pre každú horizontálnu prioritu v samostatnej tabuľke



4. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu	
Cieľ projektu	Podpora čistej mestskej dopravy integráciou zastávok MHD na Radlinského ulici a vybudovaním spoločnej prestupnej integrovanej zastávky
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov	V rámci projektu Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici bola vybudovaná obojstranná zastávka viedenského typu v lokalite pred Daňovým úradom na Radlinského ulici. Z dopravno-prevádzkového hľadiska sa realizáciou stavby integrovanej zastávky dosiahla: integrácia 5 zastávok, na Radlinského ulici smerom k Račianskemu mýtu (zrušenie zastávok električiek bez nástupného ostrovčeka uvoľní priestor IAD, zvýši jej plynulosť v smere Mýtna - Vazovova - Radlinského), Na Vazovovej sú zrušené obe zastávky električiek, na Floriánskom nám. zanikla jedna zastávka, na Radlinského pred novostavbou sa nebude obnovovať zastávka električiek. Ich integráciou vznikla jedna spoločná zastávka pre električky a autobusy, komfortnejšie prestupovanie pre cestujúcich MHD, situácia v autobusovej doprave sa upraví výraznejšie, linky z Námestia Slobody na Račianskej mýto budú jazdiť cez ulicu Imricha Karvaša. Na Vazovovej zanikne autobusová zastávka pred budovou gymnázia, keďže autobusy budú zastavovať na novej integrovanej zastávke. Územie je prejazdné aj pre IAD.

5. Popis príspevku k cieľom HP a plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP ²				
Popis príspevku k cieľom HP	1	Projekt s pomocou nenávratného finančného príspevku umožnil žiadateľovi vybudovať a zintegrovat' okolité zastávky Floriánskeho námestia - Vazovova pre električky a autobusy. Zároveň realizáciou tohto projektu sa zvýši komfort cestovania a najmä prestupovania na spoločnej obojstrannej zastávke situovanej pred daňovým úradom.		
Plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP	Názov ukazovateľa a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	0	1	1


FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU

Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu



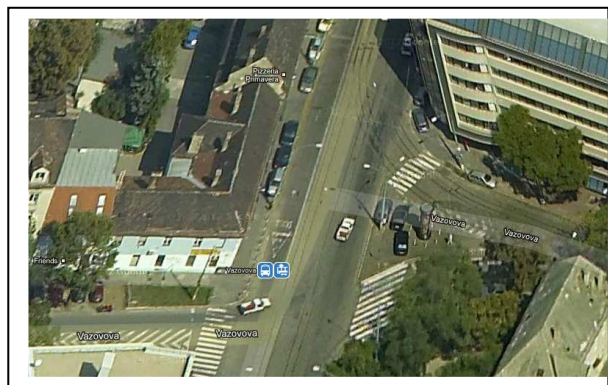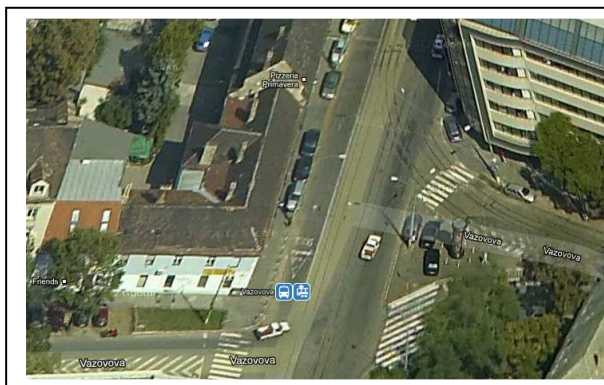

Situácia počas realizácie aktivít projektu

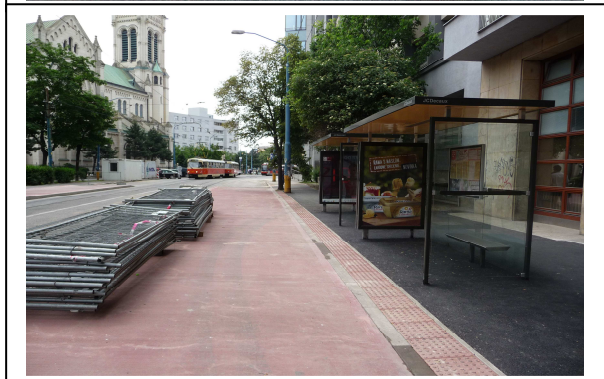

Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

